

Vuoden 2025 toimintasuunnitelma

Prioriteetit, tavoitteet, keskeisimmät toimenpiteet
ja milestonet

Hyväksytty Yleiskokouksessa
27.11.2024



DIGIVISIO

Johdon tiivistelmä




TIEKARTTA 2024–2028

DIGIVISIO

- Opin.fi-palvelun lanseeraus ja jatkokehitys käyttäjäpalautteen perusteella
- Opin.fi kaupallisen tarjonnan tuominen
- Tutkinto-opiskelun ratkaisujen tarkennus ja konseptointi sekä kyvykkyyksien rakentaminen alustalle, MVP
- HEDS/ HEDI: informaalin koulutustarjonnan tuominen, avoimen koulutustarjonnan tuominen
- HEDS/HEDI: avoimen koulutustarjonnan ilmoittautumisen POC
- Virta-esisuunnittelu
- Eurooppalaisen yhteentoimivuuden konseptin viimeistely ja rahoituksen hakeminen

- Opin.fi pienkehitys
- Tutkinto-opiskelun ratkaisut
- JOD-osaamisprofiilin rajapintatoteutus
- Rajapintojen ja luvitusten suunnittelu korkeakoulujen ulkouolelle
- 2028–2023 suunnittelu

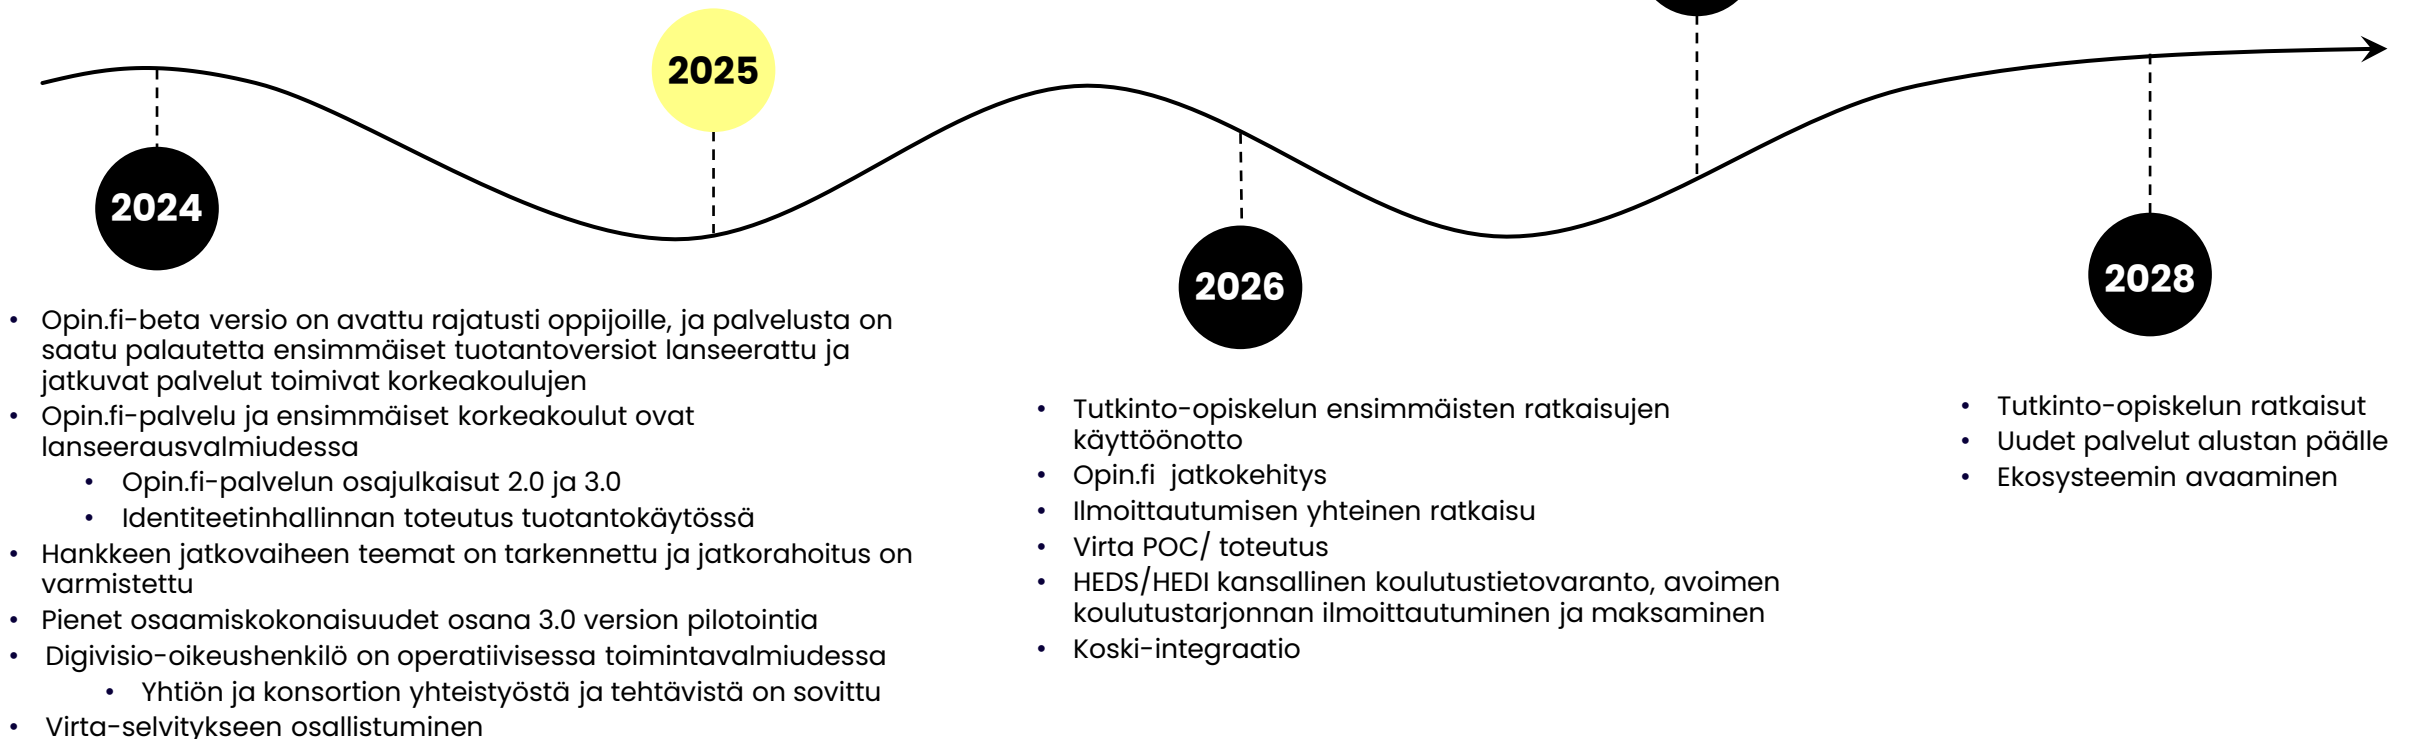

Prioriteetit 2025

- Onnistunut lanseeraus ja kattava tarjonta kaikista korkeakouluista Opin.fi palvelussa, Opin.fi-palvelun jatkokehitys palautteen perusteella.
- Digivision alustan ja liiketoimintapalvelujen hyödyntäminen tutkinto-opiskelun arvovirran ratkaisuihin
- Datakyvykkyyksien ja yhteentoimivuuden parantamisen pitkän aikavälin kestävä ratkaisu kansallisesti ja kansainvälisesti

Tavoitteet 2025


1. Opin.fi-palvelu on lanseerattu onnistuneesti, ja palvelussa on kaikkien hankkeessa mukana olevien korkeakoulujen tarjontaa. Palveluun on toteutettu palautteen perusteella priorisoidut tärkeimmät korjaukset.
2. Korkeakoulujen välistä yhteistyötä sekä tehokkuutta ja joustavuutta tutkinto-opiskelussa tuetaan Digivisio-alustan ratkaisulla.
3. Datan laadun ja yhteentoimivuuden kehittäminen mahdollistavat Digivisio alustan laajemman hyödyntämisen ja HEDS/HEDI-rajapintamallin toteuttamisen
4. Eurooppalaisen yhteentoimivuuden konsepti on valmis ja sen toteuttamiseen on saatu EU-rahoitusta
5. Tehokkaat tuotannon aikaiset yhteistyörakenteet korkeakoulujen, hanketoimiston ja HigherEd Hub Finland Oy:n välillä ovat vakiintuneet



Opin.fi-palvelun kehityksen tiekartta 2025

DIGIVISIO

Palautteella on keskeinen rooli Opin.fi-palvelun jatkokehityksessä ja se voi muuttaa alustavia suunnitelmia ja uusien ominaisuuksien kehittämisen priorisointia

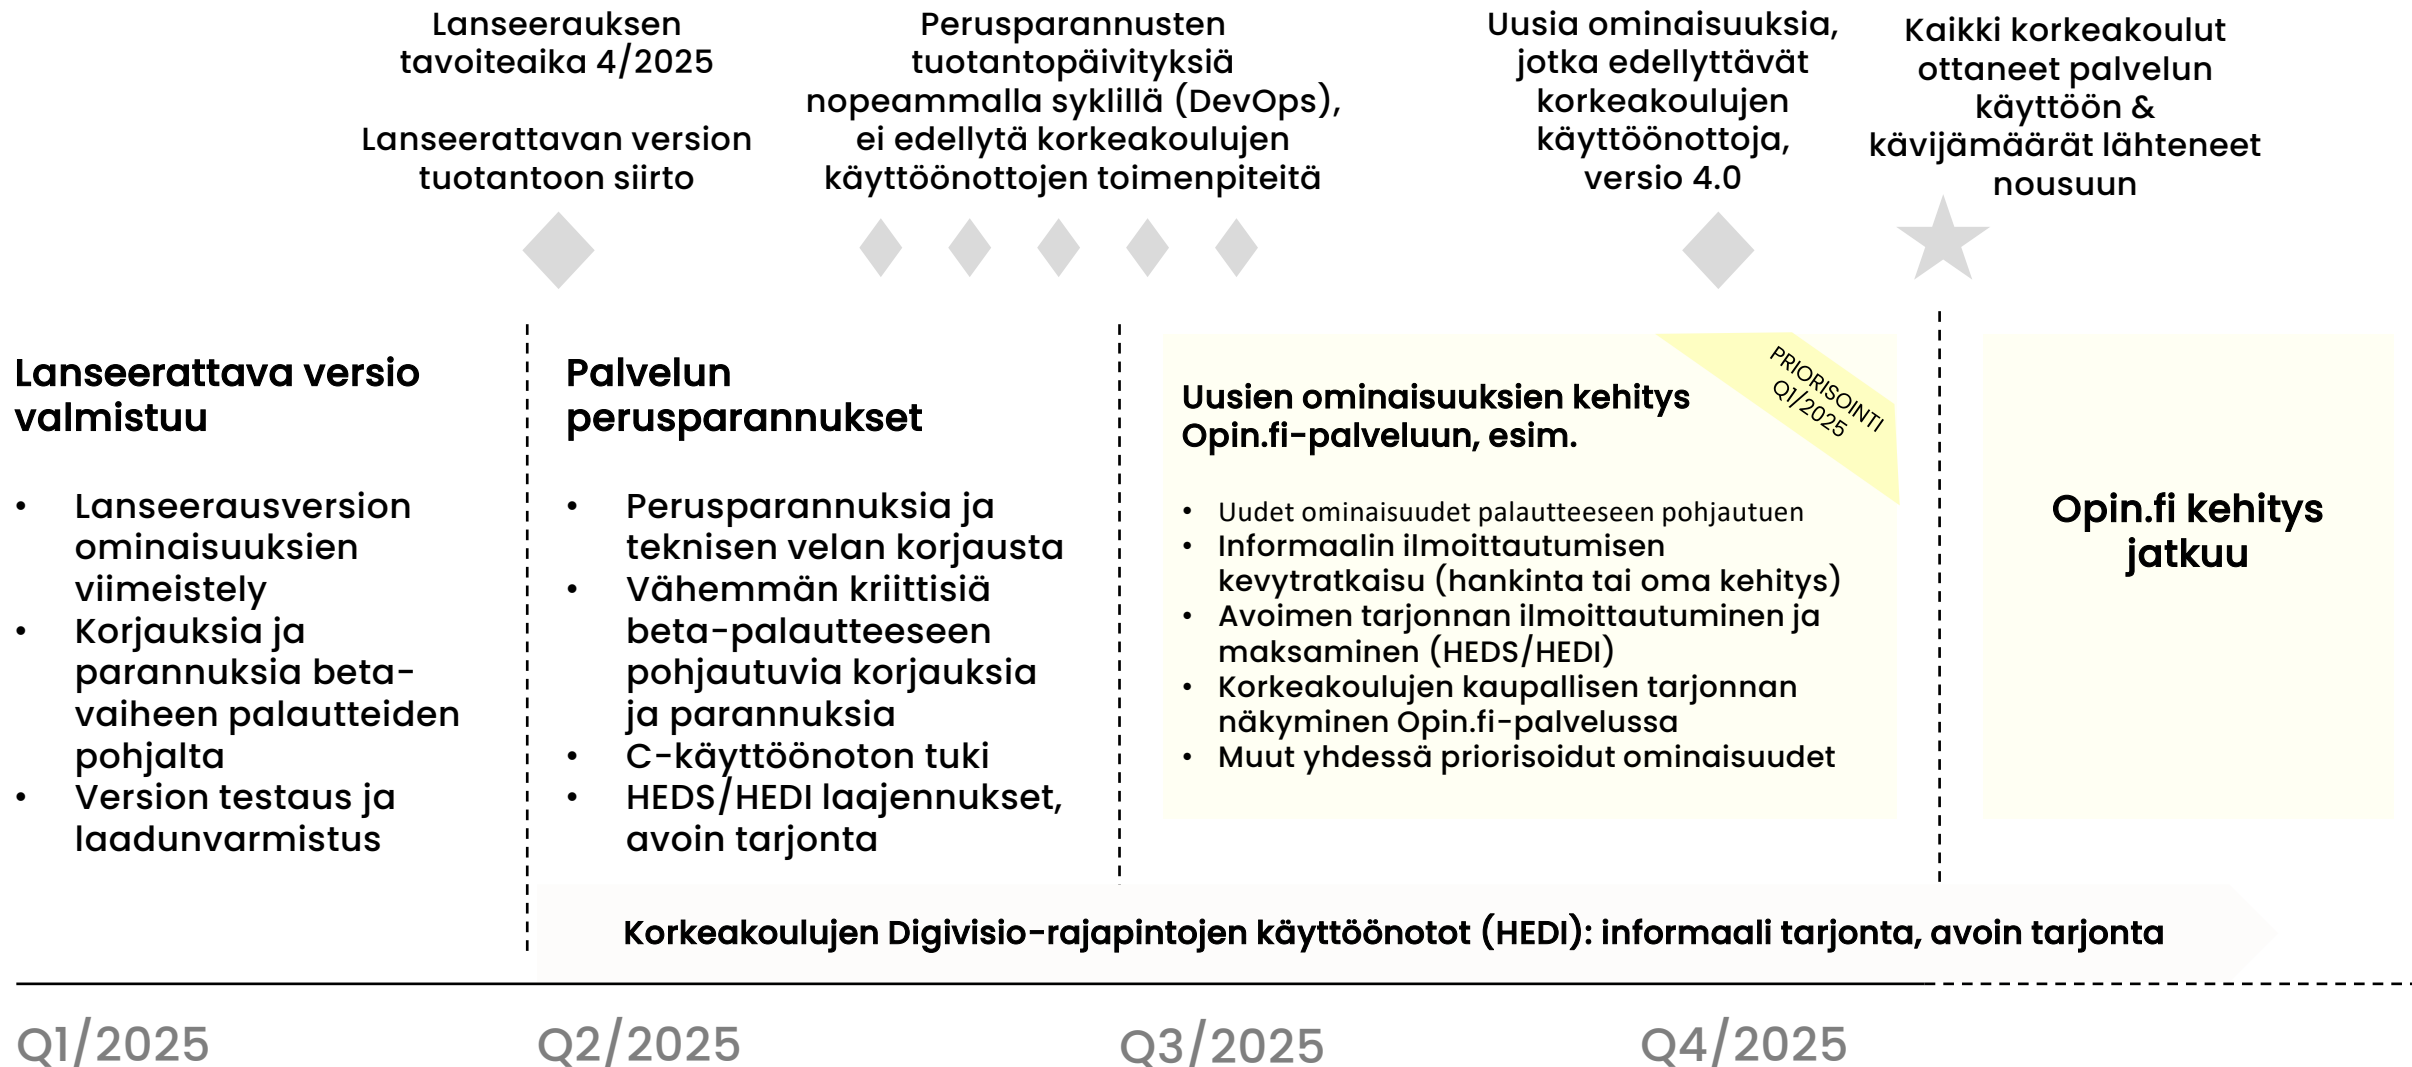

Budjetti

Hanketoimistotyö	2 296 206,77 €	24 %
CSC asiantuntijatyö	263 466,00 €	3 %
CSC lisämaksulliset tukipalvelut	100 846,00 €	1 %
Osatoteuttajatyöt	186 750,00 €	2 %
Matka- ja kululaskut	67 000,00 €	1 %
IICO	15 750,00 €	0 %
Ohjelmistokehitys	5 050 000,00 €	53 %
Palvelujen ostot	1 524 390,00 €	16 %
	9 504 409 €	100 %

Huom. Matka- ja kululaskut sisältävät kaikki luottokorteilla maksettavat kustannukset, eli myös kokoustilat- ja tarjoilut sekä joitakin tuotekehityksen ja testauksen työkaluja

Keskeiset päätökset 2025

Suunnitelma

DIGIVISIO

Q1

Q2

Q3

Q4

Lanseerauksen tavoitteiden hyväksyminen	Lanseerauksen hyväksyminen	Opin.fi-palvelun version 4.0 tuotantoon siirtymisen hyväksyminen	HEDS/HEDI eteneminen ja yhdessä linjattavat asiat, hallintamallin hyväksyminen
Datastrategian ja korkeakoulujen yhteisen alustan vision hyväksyminen	Hankkeen seuraavan vaiheen konseptien ja vaiheistuksen hyväksyminen	Ensimmäisten lanseerauksen jälkeisten kuukausien johtopäätökset	Tutkinto-opiskelun ratkaisujen tiekartan tarkentaminen, tuotantoon siirtojen hyväksyminen
Vuoden 2024 raportoinnin hyväksyminen	Opin.fi-palvelun kehittämisen tiekartan hyväksyminen	HEDS/HEDI eteneminen ja yhdessä linjattavat asiat	Virta-opintotietopalvelun uudistamiseen liittyvä suunnitelma Digivision osuuksista
Eurooppalaisen yhteentoimivuuden konseptin ja hankerahoitukseen liittyvän vaikuttamissuunnitelman hyväksyminen	Riskienhallintasuunnitelman tarkistus	Riskienhallintasuunnitelman tarkistus	Opin.fi-palvelun brändin omistajuuteen ja markkinointivastuuseen liittyvät linjaukset
HEDS/HEDI tiekartan hyväksyminen	Neljännesvuosikatsauksen hyväksyminen	Neljännesvuosikatsauksen hyväksyminen	Hankkeen ja yhtiön roolien tarkistukset
Kumppanuussuunnitelmien käsittely			2026 toimintasuunnitelman hyväksyminen
			Neljännesvuosikatsauksen hyväksyminen

Merkitävimmät riskit

Riskin numero	Riskiluokka	Riskin kuvaus	Oletettu seuraus	Toden- näköisyys (T) 1-4	Vakavuus (V) 1-4	Riski- luokitus (R)	Status	Mitigaatiot	Vastuu
1	Strateginen	Korkeakoulujen laaja sitoutuminen jää puuttumaan, koska yhteistä tulevaisuuden kuvaa ei jaeta tai tehtyihin linjauksiin ei sitouduta	Yhteisiä palveluja ei saada rakennettua, tai niitä ei oteta käyttöön. Korkeakoulut tekevät rinnakkaisia omia ratkaisuja. Konsortioyhteistyön pitkän aikavälin kestävää toimintamallia ei saada synnytettyä.	3	4	12	Omistettu	Yhteisen tulevaisuudenkuvan luomiseen ja ylläpitämiseen panostetaan koko hankkeen ajan. Avoin keskustelukulttuuri yhteisissä ryhmissä ja päätöksentekoeleimissä. Hanketoimiston ja rehtoreiden/ Digivisio omistajien tiivis avoin kommunikaatio. Kannustetaan korkeakoulujen omistajia selkeyttämään strategiset kysymykset ja niiden sisäiset prosessit (mm. datan laatu isossa kuvassa, teemojen tunnistamisen prosessi, Opin.fi-palvelun sisällöllinen omistajuus).	Ohjausryhmä, korkeakoulut, hanketoimisto
18	Strateginen	Hankkeen aikataulus on erittäin tiukka eikä siitä pystytä pitämään kiinni.	Kaikkia RRF-tavoitearkkitehtuurin mukaisia tavoitteita ei saada toteutettua tai aikatauluja joudutaan siirtämään. Aikataulukriittisyys ajaa yli laatukriittisyyden ja hankkeessa tehdään yhteensopimatonta tai päällekkäistä työtä muun koulutustoimialan kanssa. Vaikutus työhyvinvointiin.	4	3	12	Omistettu	Hankkeen scopea tarkennetaan suhteessa aikatauluun, huolehditaan työn ja resurssien käytön priorisoinnista.	Ohjausryhmä, hanketoimisto
3	Operatiivinen	Korkeakoulut eivät resursoi Digivisio-työtä riittävästi (muutostyö, tarjonnan päivittäminen Opin.fi-palvelussa, datan yhdenmukaistaminen ja yhteentoimivuus), tai kaikilla korkeakouluilla ei ole riittävä osaamista muutosten toteuttamiseen (esim. HEDS/HEDI).	Korkeakoulujen sitoutuminen vaihtelee merkittävästi, osa korkeakouluista ei pysy työssä mukana eikä saa hyötyä ratkaisuista.	3	4	12	Omistettu	Muutostyön tuki, hyvien käytäntöjen jakaminen. Hyötyjen analysointi ja korostaminen. Vertaisoppiminen ja -tuki.	Korkeakoulut, ohjausryhmä
26	Operatiivinen	Teknologian (esim. tekoäly) nopea kehitys tuo uutta säätelyä ja mahdollisuudet arvioidaan korkeakouluissa eri tavalla.	Muuttuvat vaatimukset ja tarve tehdä muutoksia toteutuksiin. Erilaiset mielipiteet ja esimerkiksi ohjeistukset hyödynnettävyydestä korkeakouluissa.	4	3	12	Omistettu	Teknologiavalintojen- ja datastrategian sekä tekoälyn eettisen periaatteiden jatkuva tarkastelu, kokeilut, säätelyn seuraaminen.	Hanketoimisto
6	Strateginen	Riippuvuudet muihin valtakunnallisiin, tai korkeakoulujen omiin palveluihin hidastavat työtä merkittävästi tai pakottavat tekemään ei-toivottuja ratkaisuja	Aikataulun viivästyminen, kustannusten kasvaminen, fokuksen hajoaminen. Hankkeen laajuuden kapeneminen tai päällekkäisten palvelujen syntyminen.	3	3	9	Omistettu	Tiivis yhteistyö merkittävimpien palvelujen omistajien kanssa ja muutostarpeiden kuvaaminen niin aikaisessa vaiheessa kuin mahdollista. Kumppanuussuunnitelma. Tarvittavien muutostöiden maksaminen hankerahoituksesta. Työnjakokeskustelun aktiivinen vieminen JOD-yhteistyö rakenteisiin ja keskustelu suoraan OKM:n kanssa. Yhteisen fooruminen (pyöreä pöytä) luominen: Peppi, Sis, OPH ja CSC:n Virta-tiimi keskustelemaan yhdessä. Yhteinen näkemys Ripa-tiimin ja korkeakoulujen kanssa Digivision suhteesta Ripa-palveluun. Yhteinen tiekarttatyö tärkeimpien kumppaneiden kanssa.	Hanketoimisto, ohjausryhmä

